


ANEXO C
MODELO DE CRONOGRAMA DE PROYECTO

COPIA CONTROLADA



Id	Nombre de tarea	Desviación	Duración	Comienzo	Fin	Duración de línea base	Comienzo de línea base	Fin de línea base	2, 2	Semestre 1, 1	Semestre 2, 2	Semestre 1, 1	Semestre 2, 2	Semestre 1, 1	Semestre 2, 2	Semestre 1, 1	Semestre 2, 2	0%
1	NOMBRE DEL PROYECTO	0	892 días	mié 11/1/25	vie 11/6/27	892 días	mié 11/1/25	vie 11/6/27										0%
2	APROBACIONES Y PERMISOS	0	500 días	mié 11/1/25	vie 15/5/26	500 días	mié 11/1/25	vie 15/5/26										0%
3	Aprobaciones Internas y Asignación de Presupuesto	0	47 días	mié 11/1/25	jue 6/3/25	47 días	mié 11/1/25	jue 6/3/25										0%
4	Elaboración de Informe a Comité	0	5 días	mié 11/1/25	mar 7/1/25	5 días	mié 11/1/25	mar 7/1/25										0%
5	Aprobación de Comité	0	1 día	mié 15/1/25	mié 15/1/25	1 día	mié 15/1/25	mié 15/1/25										0%
6	Acta de aprobación de Comité	0	5 días	jue 16/1/25	mié 22/1/25	5 días	jue 16/1/25	mié 22/1/25										0%
7	Elaboración de Informe a Directorio	0	5 días	jue 23/1/25	mié 29/1/25	5 días	jue 23/1/25	mié 29/1/25										0%
8	Aprobación de Informe a Directorio	0	1 día	jue 13/2/25	jue 13/2/25	1 día	jue 13/2/25	jue 13/2/25										0%
9	Acta de aprobación de Directorio	0	10 días	vie 14/2/25	jue 27/2/25	10 días	vie 14/2/25	jue 27/2/25										0%
10	Asignación de Presupuesto	0	5 días	vie 28/2/25	jue 6/3/25	5 días	vie 28/2/25	jue 6/3/25										0%
11	Obtención de Licencia Ambiental	0	421 días	vie 7/3/25	vie 1/5/26	421 días	vie 7/3/25	vie 1/5/26										0%
26	Aprobación del Perfil por parte de la ANH	0	435 días	vie 7/3/25	vie 15/5/26	435 días	vie 7/3/25	vie 15/5/26										0%
31	Constitución de Servidumbre	0	172 días	jue 28/8/25	dom 15/2/26	172 días	jue 28/8/25	dom 15/2/26										0%
35	INGENIERÍA	0	264 días	vie 7/3/25	mar 25/11/25	264 días	vie 7/3/25	mar 25/11/25										0%
36	Elaboración de TDR/PET y preparación SOLPED	0	15 días	vie 7/3/25	vie 28/3/25	15 días	vie 7/3/25	vie 28/3/25										0%
39	Actividades Previas a la Autorización de Inicio de Proceso	0	7 días	vie 28/3/25	mar 8/4/25	7 días	vie 28/3/25	mar 8/4/25										0%
46	Proceso de Contratación Menor hasta Bs 1.000.000	0	35 días	mié 9/4/25	jue 29/5/25	35 días	mié 9/4/25	jue 29/5/25										0%
47	Proceso de contratación de bienes y servicios	0	22 días	mié 9/4/25	vie 9/5/25	22 días	mié 9/4/25	vie 9/5/25										0%
62	Aprobación del Resultado del Proceso de Contratación	0	3 días	lun 12/5/25	mié 14/5/25	3 días	lun 12/5/25	mié 14/5/25										0%
65	Obligaciones del Adjudicatario	0	6 días	jue 15/5/25	jue 22/5/25	6 días	jue 15/5/25	jue 22/5/25										0%
68	Suscripción de contrato	0	4 días	vie 23/5/25	jue 29/5/25	4 días	vie 23/5/25	jue 29/5/25										0%
74	Ejecución de Ingeniería	0	180 días	jue 29/5/25	mar 25/11/25	180 días	jue 29/5/25	mar 25/11/25										0%
83	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES	0	289 días	mié 26/11/25	jue 10/9/26	289 días	mié 26/11/25	jue 10/9/26										0%
84	Material mayor	0	289 días	mié 26/11/25	jue 10/9/26	289 días	mié 26/11/25	jue 10/9/26										0%
136	Material menor	0	182 días	mié 26/11/25	mar 26/5/26	182 días	mié 26/11/25	mar 26/5/26										0%
179	CONSTRUCCIÓN / SERVICIOS	0	417 días	lun 26/1/26	jue 18/3/27	417 días	lun 26/1/26	jue 18/3/27										0%
180	Autorización de Directorio para Inicio de Proceso	0	21 días	lun 26/1/26	lun 23/2/26	21 días	lun 26/1/26	lun 23/2/26										0%
184	Elaboración de TDR/PET y preparación SOLPED	0	15 días	mar 3/2/26	lun 23/2/26	15 días	mar 3/2/26	lun 23/2/26										0%
187	Actividades Previas a la Autorización de Inicio de Proceso	0	11 días	lun 23/2/26	mar 10/3/26	11 días	lun 23/2/26	mar 10/3/26										0%
194	Proceso de Contratación Mayor a Bs 1.000.000	0	53 días	mié 11/3/26	vie 22/5/26	53 días	mié 11/3/26	vie 22/5/26										0%
224	Construcción	0	300 días	vie 22/5/26	jue 18/3/27	300 días	vie 22/5/26	jue 18/3/27										0%
225	Emisión Orden de Proceder	0	0 días	vie 22/5/26	vie 22/5/26	0 días	vie 22/5/26	vie 22/5/26										0%
226	Carpeta de Inicio	0	30 días	sáb 23/5/26	dom 21/6/26	30 días	sáb 23/5/26	dom 21/6/26										0%
227	Movilización, instalación de faenas y obrador	0	30 días	lun 22/6/26	mar 21/7/26	30 días	lun 22/6/26	mar 21/7/26										0%
228	Construcción y montaje	0	150 días	mié 22/7/26	vie 18/12/26	150 días	mié 22/7/26	vie 18/12/26										0%
229	Pruebas hidrostáticas	0	10 días	sáb 19/12/26	lun 28/12/26	10 días	sáb 19/12/26	lun 28/12/26										0%
230	Pre-comisionado y comisionado	0	10 días	mar 29/12/26	jue 7/1/27	10 días	mar 29/12/26	jue 7/1/27										0%
231	Empaquetado	0	10 días	vie 8/1/27	dom 17/1/27	10 días	vie 8/1/27	dom 17/1/27										0%
232	Puesta en Marcha	0	0 días	dom 17/1/27	dom 17/1/27	0 días	dom 17/1/27	dom 17/1/27										0%
233	Limpieza y restauración de derecho de vía	0	20 días	lun 18/1/27	sáb 6/2/27	20 días	lun 18/1/27	sáb 6/2/27										0%
234	Desmovilización	0	10 días	dom 7/2/27	mar 16/2/27	10 días	dom 7/2/27	mar 16/2/27										0%
235	Aprobación databook y planos As-Built	0	30 días	mié 17/2/27	jue 18/3/27	30 días	mié 17/2/27	jue 18/3/27										0%
236	CIERRE DE PROYECTO	0	60 días	vie 19/3/27	vie 11/6/27	60 días	vie 19/3/27	vie 11/6/27										0%
237	Cierre contable y transferencia al activo fijo	0	60 días	vie 19/3/27	vie 11/6/27	60 días	vie 19/3/27	vie 11/6/27										0%
244	Cierre administrativo y transferencia al activo cen	0	25 días	vie 19/3/27	jue 22/4/27	25 días	vie 19/3/27	jue 22/4/27										0%

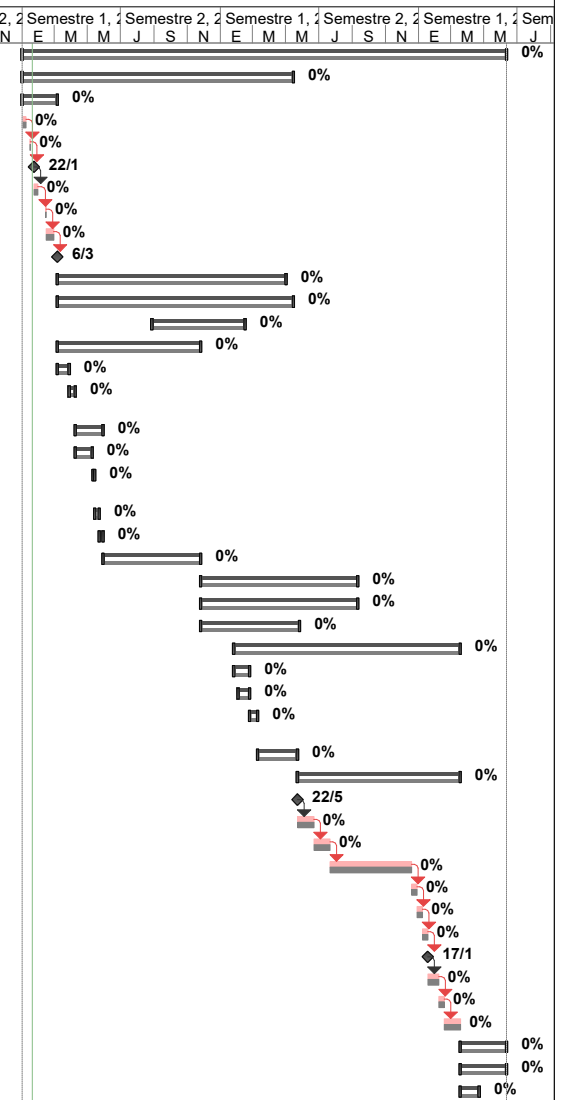

Hito de línea base	◇	Tarea	—	solo fin]	Resumen	—	Tarea inactiva	—
Resumen de línea base	—	División	solo duración	—	Resumen manual	—	Hito inactivo	◇
Tareas críticas	—	Progreso de tarea	—	División de la línea base	Resumen del proyecto	—	Resumen inactivo	—
División crítica	Tarea manual	—	Hito	◆	Tareas externas	—	Fecha límite	↓
Progreso de tarea crítica	—	solo el comienzo	[Progreso del resumen	—	Hito externo	◆	Línea base	—
